



Vmesno vrednotenje SLR LAS s CILjem 2018

Idrija, februar 2019

V programskem obdobju 2014-2020, sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija lokalnega razvoja.

Za obdobje do 31. 12. 2018, je potrebno v skladu s SLR LAS s CILjem izvesti vmesno vrednotenje SLR. Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij oz. programov, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Za vrednotenje so zelo pomembni podatki, pridobljeni s spremljanjem SLR. Vrednotilo se je obvezne kazalnike na ravni CLLD za EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni LAS s CILjem. Poleg tega je LAS spremljal tudi specifične teme vrednotenja, ki so: število podprtih partnerstev, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij CLLD, kdo so upravičenci, ki so se prijavi na javni poziv, na katerem tematskem področju (ukrepu) ni prijav, teritorialna pokritost, ipd.), ki bodo prispevali h kakovosti vrednotenja SLR.

LAS s CILjem bo o rezultatih vrednotenij informiral in obveščal naslednje ciljne skupine:

- organe LAS s CILjem (skupščina ali upravni odbor),
- partnerjev vključene v izvajanje operacij (projektov),
- druge deležnike na območju LAS (širša javnost).

Ciljne skupine se bo o vrednotenju SLR obveščalo na sestankih in sejah ter na spletni strani LAS s CILjem.

Finančni načrt Izvajanje SLR LAS s CILjem:

Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih (črpanje sredstev s strani pristojnega ministrstva):

Podukrep	Sklad	2016 dejanska dinamika	2017 dejanska dinamika	2018 dejanska dinamika	Predvidena sredstva po SLR (do leta 2023)	% Počrpanih sredstev
Pripravljalna podpora	EKSRP /ESRR	0	20.000,00 EUR	0	20.000,00 EUR	100%
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost	EKSRP	0	0	0	788.670,00 EUR	0
	ESRR	0	0	136.094,84 EUR	494.354,00 EUR	27,35%
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine	ESRR	0	0	7.000,00 EUR	44.000,00 EUR	15,91%
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije	ESRR	12.322,23 EUR	58.787,77 EUR	47.406,00 EUR	331.756,00 EUR	35,73%
Skupaj		12.322,23 EUR	78.787,77 EUR	190.500,84 EUR	1.678,780 EUR	16,78%

Načrtovana in dejanska razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja po letih (za podukrepa Podpora z izvajanje operacij v okviru SLR in priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS):

Tematsko področje	Sklad	2016	2017 načrtovano	2017 dejanska razdelitev	2018 načrtovano	2018 dejanska razdelitev
Ustvarjanje delovnih mest	EKSRP	0	0	0	20.000,00 EUR	0
	ESRR	0	9.350,00 EUR	0	81.437,50 EUR	81.383,01 EUR
Razvoj osnovnih storitev	EKSRP	0	0	0	122.050,00 EUR	0
Varstvo okolja in ohranjanje narave	EKSRP	0	0	0	35.000,00 EUR	0
	ESRR	0	0	0	0	0
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	EKSRP	0	0	0	0	0
	ESRR	0	0	0	36.362,90 EUR	61.711,83 EUR
Skupaj		0	9.350,00 EUR	0	294.850,40 EUR	143.094,84 EUR

Podukrep: Pripravljalna podpora namenjena za aktivnosti izdelave SLR, je bila s strani ministerstev izplačana v letu 2017.

Podukrep: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

V letu 2017 je LAS s CILjem prejel tri pozitivne odločbe za projekte sodelovanja LAS, sofinancirane iz EKSRP sklada v višini 146.060,69 EUR (Odperta vrata kmetij, Novi izzivi slovenske drobnice, Med-o-vita). Projekti se bodo izvajali od decembra 2017 do aprila 2020. Dva zahtevka operacij Novi izzivi slovenske drobnice in Med-o-vita, sta bila potrjena v letu 2018, izplačana pa v letu 2019. V letu 2018 je LAS s CILjem prejel tudi pozitivno odločbo operacije Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je upravičena do sofinanciranja v višini 84.911,86 EUR. Za projekte iz EKSRP sklada, je bilo potrebno kandidirati na razpisu MKGP, zato ta sredstva niso vključena v finančnih podatkih SLR LAS s CILjem (dodatna sredstva, ki so se pridobila na območju). V letu 2018 se je zaključil projekt Zgodbe rok in krajev iz ESRR sklada, ki je bil tudi izplačan v višini 7.000,00 EUR.

Podukrep: Podpora za tekoče stroške in animacijo.

Vodilni partner LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija v skladu z finančnim planom in letnim načrtom aktivnosti izvaja vodenje in delovanje LAS s CILjem. LAS v skladu s predvidenim planom vlaga zahtevke za tekoče stroške in stroške animacije. Del načrtovanih sredstev iz leta 2016 se je prenesel v leto 2017 in bil realiziran. V letu 2018, je črpanje potekalo v skladu s predvidenimi sredstvi.

Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih in razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja, ki je bila načrtovana ob pripravi SLR, se razlikuje od dejanskega stanja predvsem zaradi zamika izvajanja programa in črpanja sredstev na ravni države.

Podukrep: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Operacije LAS s CILjem:

V letu 2017 so se izvajale tri operacije LAS s Ciljem (Formica Cerčno – Idrija – Logatec, Dobimo se na tržnici in Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem), ki jih je koordinirala ICRA d.o.o. Idrija. Aktivnosti operacij Formica Cerčno – Idrija – Logatec in Dobimo se na tržnici, so se zaključile v decembru 2017, operacija Vključimo se, pa se je nadaljevala v letu 2018. V letu 2018 so bile tudi izplačane (2. zahtevke operacije Vključimo se, je bil oddan v letu 2019). V vseh treh operacijah, so kot partnerji sodelovali LAS s CILjem in Občine vključene v LAS (Cerčno, Idrija, Logatec). Operacije so bile pripravljene na podlagi potreb območja, ki so se izkazale ob pripravi SLR LAS s CILjem (vključevaje ranljivih skupin, trženje lokalnih produktov, vzpostavitve coworkingov,...). Vse tri operacije so bile sofinancirane iz ESRR sklada v skupni višini 79.394,40 EUR. V letu 2018 se je na MGRT prijavilo in tudi začelo izvajati operaciji Formica 2 in Dobimo se na tržnici 2, ki po aktivnostih predstavljata nadaljevanje predhodnih operacij in imata kot zastavljena kazalnika vzpostavitve dveh delovnih mest.

Operacije izbrane na javnem pozivu LAS s CILjem:

1. javni poziv LAS s CILjem je bil objavljen 29. 12. 2016 in zaključen 15. 2. 2017. Za oba sklada je bilo razpisanih 404.708,47 EUR. Na javni poziv je bilo prijavljenih 16 operacij. Tri za ESRR sklad in 13 za EKSRP sklad. Dve vlogi sta bili s stani ocenjevalne komisije zavrženi. Skupna zaprosena vrednost vseh prijavljenih operacij je znašala 321.305,60 EUR. Od tega je bilo zaprosenih sredstev za ESRR sklad v skupni vrednosti 256.145,35 EUR, za EKSRP sklad pa 65.160,25 EUR.

Za EKSRP sklad je bilo najmanj zaprosenih sredstev na ukrepih Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov in Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest. Na ukrepih Razvoj novih turističnih produktov in storitev ter Ohranjanje in oživljanje dediščine območja, pa je bila višina zaprosenih sredstev višja od višine razpisanih sredstev.

Za ESRR sklad je bilo najmanj projektних prijav na ukrepu Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest, največ pa na ukrepu Aktivacija potencialov ranljivih skupin, kjer je bila višina zaprosenih sredstev višja od višine razpisanih sredstev.

S strani pristojnih ministrstev so bili iz ESRR sklada potrjeni trije projekti, ki so bili v letu 2018 zaključeni in izplačani v višini 73.063,34 EUR. Iz EKSRP sklada, pa sta bila za izvajanje v letu 2018 potrjena dva projekta, za katera sta bila v letu 2018 oddana dva zahtevka na ARSKTRP, ki pa še nista bila potrjena in izplačana.

2. javni poziv LAS s CILjem je bil objavljen 31. 8. 2018 in zaključen 2. 11. 2018. V 2. javnem pozivu, je bilo za oba sklada razpisanih 769.310,00 EUR. Na javni poziv je bilo prijavljenih 14 operacij. Od tega je prispela ena operacija za sofinanciranje iz ESRR sklada, ostalih 13 pa za sofinanciranje iz EKSRP sklada. Pri EKSRP skladu je bila ena vloga s stani ocenjevalne komisije zavržena, ena pa ni dosegla dovolj točk za sofinanciranje, tako da je bilo za sofinanciranje izbranih 12 projektov, ki pa še niso potrjeni s strani pristojnih ministrstev.

Za EKSRP sklad so v celoti ostala nepokorščina sredstva na ukrepu Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. Sredstva so ostala tudi na drugih ukrepih, razen ukrepu Razvoj novih turističnih produktov in storitev, kjer je zmanjkalo sredstev za realizacijo vseh projektnih aktivnosti.

Pri ESRR skladu bo prijavljena operacija sofinancirana iz ukrepa Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest, na ostalih razpisanih ukrepih pa ni bilo prijav, tako da so sredstva ostala neporabljena.

Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za ESRR sklad (1. in 2. JP LAS s CILjem)

Tematsko področje	Ukrepi	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 1. JP	Višina zaprošenih sredstev 1. JP	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 2. JP	Višina zaprošenih sredstev 2. JP
USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest	108.222,06 EUR	27.320,62 EUR	76.998,00 EUR	25.276,21 EUR
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	Aktivacija potencialov ranljivih skupin	36.617,81 EUR	37.839,63 EUR	16.543,00 EUR	0
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov	0	0	25.137,00 EUR	0
Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev (sklad ESRR)		144.839,87 EUR	65.160,25 EUR	118.679,00 EUR	25.276,21 EUR

Ostanek sredstev na ESRR skladu 93.401,79 EUR.

Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za EKSRP sklad (1. in 2. JP)

Tematsko področje	Ukrepi	Višina razpisanih nepovratnih sredstev	Višina zaprošenih sredstev 1. JP	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 2. JP	Višina zaprošenih sredstev 2. JP
USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest	52.789,50 EUR	29.305,96 EUR	245.152,00 EUR	39.998,80 EUR
RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV	Razvoj novih turističnih produktov in storitev	55.942,01 EUR	58.072,64 EUR	92.091,00 EUR	108.784,76 EUR
	Ohranjanje in oživljanje dediščine območja	58.637,04 EUR	59.906,01 EUR	114.579,00 EUR	89.351,44 EUR
	Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju	0 EUR	0 EUR	30.804,00 EUR	0 EUR
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov	92.500,05 EUR	10.754,69 EUR	109.613,00 EUR	74.127,25 EUR
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	Aktivacija potencialov ranljivih skupin	0 EUR	0 EUR	58.392,00 EUR	51.067,66 EUR
Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev (sklad EKSRP)		259.868,60 EUR	158.039,30 EUR	650.631,00 EUR	363.329,91 EUR

Ostanek sredstev na EKSRP skladu 287.301,09 EUR

Skupaj ostanek sredstev iz ESRR in EKSRP sklada: 380.702,88 EUR.

Skupaj višina razpisanih in zaprošenih sredstev

Tematsko področje	Ukrepi	Sklad	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 1 in 2 JP	Višina zaprošenih sredstev 1 in 2 JP	Ostanek sredstev po ukrepih
USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest	ESRR	185.220,06 EUR	52.596,83 EUR	132.623,23 EUR
		EKSRP	297.941,50 EUR	69.304,76 EUR	228.636,74 EUR
RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV	Razvoj novih turističnih produktov in storitev	EKSRP	148.033,01 EUR	166.857,40 EUR	-18.824,39 EUR
	Ohranjanje in oživljanje dediščine območja	EKSRP	173.216,04 EUR	149.257,45 EUR	23.958,59 EUR
	Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju	EKSRP	30.804,00 EUR	0,00 EUR	30.804,00 EUR
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov	ESRR	25.137,00 EUR	0,00 EUR	25.137,00 EUR
		EKSRP	202.113,05 EUR	84.881,94 EUR	117.231,11 EUR
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	Aktivacija potencialov ranljivih skupin	ESRR	53.160,81 EUR	37.839,63 EUR	15.321,18 EUR
		EKSRP	58.392,00 EUR	51.067,66 EUR	7.324,34 EUR
Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev (ESRR in EKSRP)			1174.017,47 EUR	611.805,67 EUR	

Rezultati vrednotenij za leto 2018:

Napredovanje proti ciljnim kazalnikom LAS s CILjem in obveznim kazalnikom posameznega sklada:

EKSRP SKLAD

Kazalniki	Mejnik na dan 31.12.2018	Dosežena vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Število ustvarjenih delovnih mest	0	0	0
Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest	1	1	8
Število novih turističnih produktov ali storitev	0	0	5
Število enot dediščine na območju, ki so bile ohranjene ali jim je bila dodana vsebina	1	1	4
Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju	0	0	1
Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov	0	0	4
Število vključenih posameznikov iz ranljivih skupin	0	0	10
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	0	0	12
Število novo ustvarjenih mest	0	0	0
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem	6%	7%	100%
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	0%	0	100%

ESRR SKLAD

Kazalniki	Mejnik na dan 31.12.2018	Dosežena vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2018	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Število novo ustvarjenih delovnih mest	2	2	3
Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest	2	10	4
Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov	0	0	1
Število vključenih posameznikov iz ranljivih skupin	200	1244	220
Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje CLLD	8	45	12
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	2	6	10
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem*	20%	26,97%	100%
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	20%	98,57%	100%

Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2018 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki oz. mejniki potrjeni v SLR.

Analiza javnih razpisov LAS s CILjem

V izvedeno analizo so vključeni tudi podatki iz izbranih projektov 2. JP, ki še niso potrjeni s strani pristojnih ministrstev.

Število podprtih partnerstev (projektov iz 1. JP): 5


EKSRP sklad: Franja nas povezuje, G(r)ozd za prihodnost.

ESRR sklad: Startup! Idrija – Cerčno, Aktivirajmo se, Povezovanje urbanih naselij občine Logatec.

Število podprtih partnerstev (projektov iz 2. JP): 12


EKSRP sklad: i-DEnDI, Odkrijmo žgalnice, MC Mobil, E-KOLOško KOLOvratenje, Krovna destnacijska znamka Idrija, Gartlc, Kulturna dediščina kot poslovna priložnost, Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH - II), Sestavljamo čisto okolje Občine Logatec, Prijazni do okolja (lokalno z manj odpadki), Medeni krog.

ESRR sklad: Zmanjšaj!

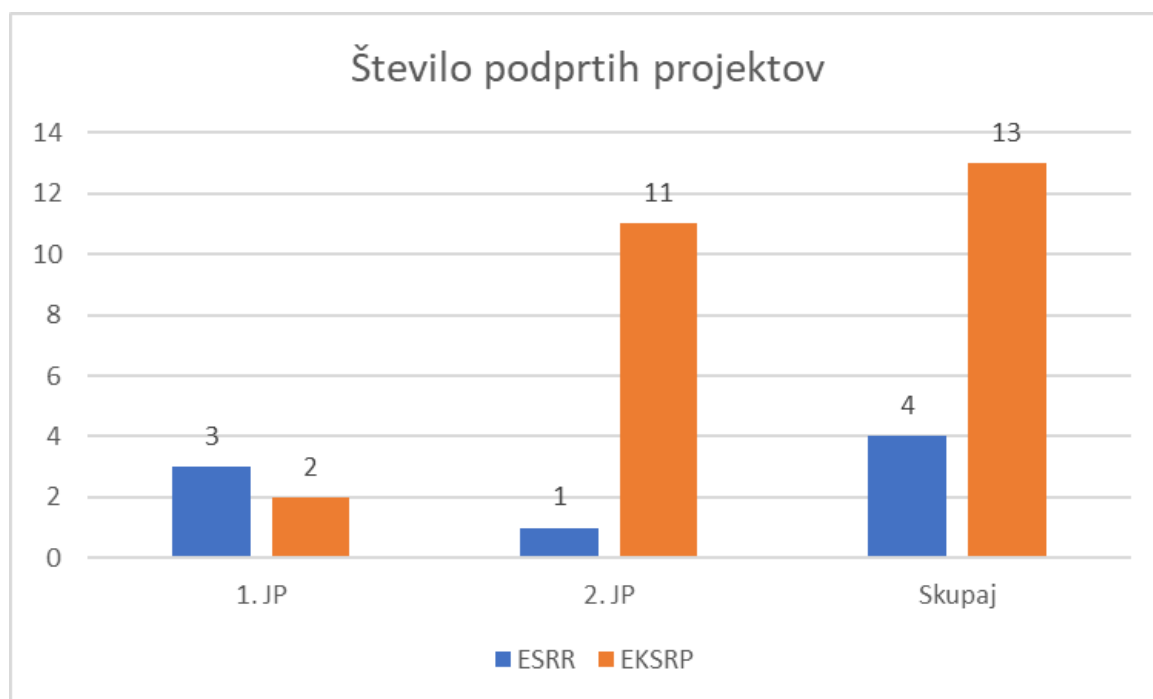


Več prijav s strani prijaviteljev je bilo na kmetijskem skladu (razpisanih tudi več sredstev). Na 1. JP je bilo za EKSRP prijavljenih 13 projektov a so kasneje partnerji odstopili, tako da je ARSKTRP odločala o potrditvi dveh projektov. Na 2. JP je bilo iz EKSRP sklada izbranih 11 projektov, ki pa še niso bili potrjeni s strani ARSKTRP.

Število deležnikov (partnerjev) vključenih v izvajanje operacij

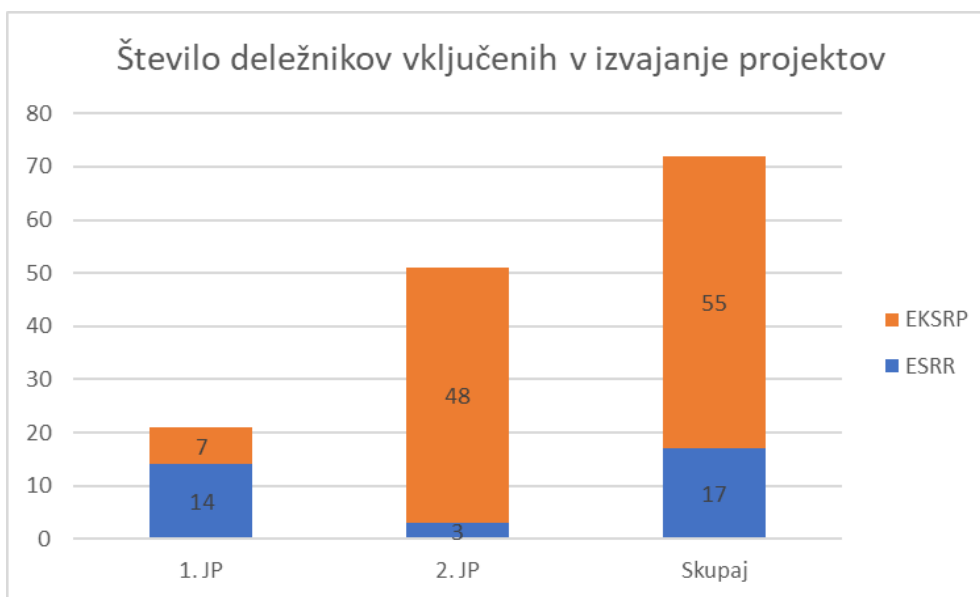

V projektih iz obeh razpisov je sodelovalo/sodeluje 72 partnerjev. Od tega jih je 55 vključenih v projekte iz EKSRRP sklada, 17 pa iz ESRR sklada. Nekateri partnerji sodelujejo v več projektih in so v zbranih podatkih šteti večkrat (kot partner v posameznem projektu).


Struktura upravičencev potrjenih na javnih pozivih

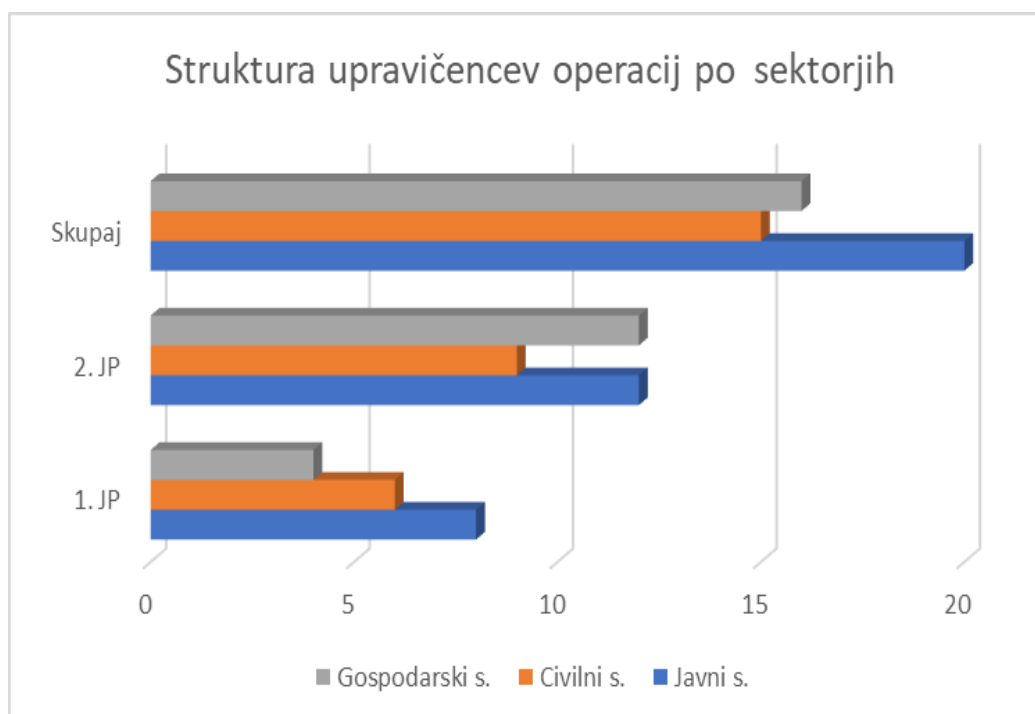

Največ upravičencev posameznih projektov izhaja iz javnega sektorja (20), sledi gospodarski sektor (16) in nato civilni sektor (15). VP LAS s CILjem je vsem sektorjem omogočil

enakovredno obravnavo (svetovanja). Razlog, da kot partner v projektih prevladuje javni sektor je najverjetneje v razpoložljivi kadrovske kapaciteti, ki ima tudi izkušnje s prijavi oz. sodelovanjem v tovrstnih projektih.

Teritorialna pokritost – lokacije partnerjev v projektih

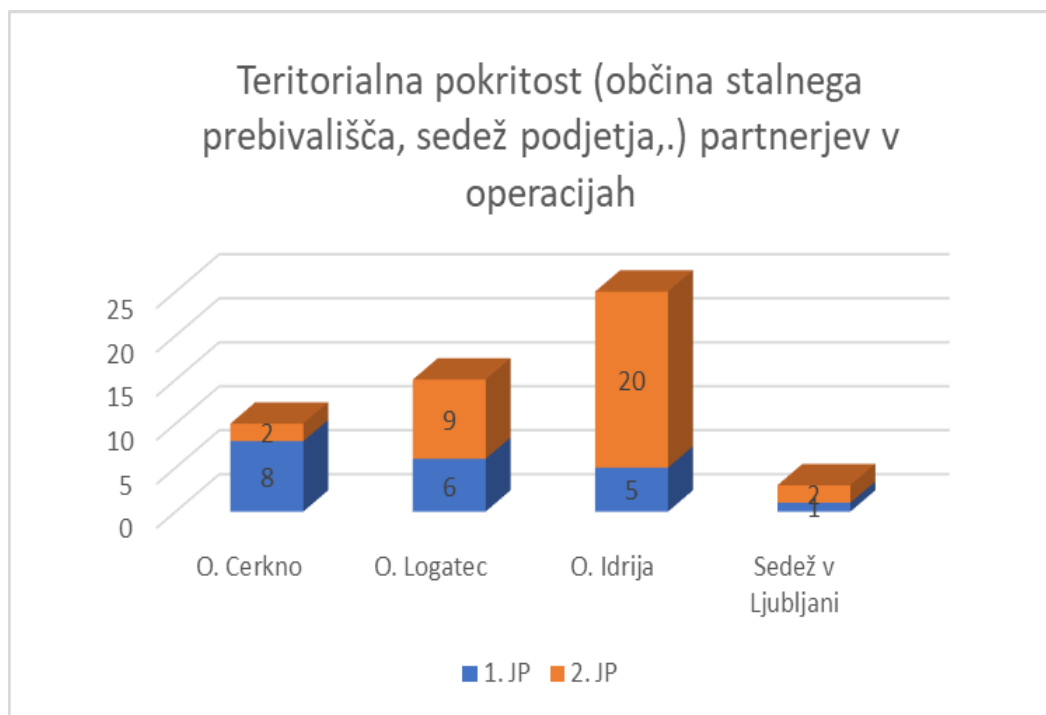

Največ partnerjev projektov izhaja iz občine Idrija (25), sledi občina Logatec (15), 10 iz Občine Cerkljeva ter 3 partnerji, ki imajo sedež v Ljubljani, delujejo pa na območju LAS s CILjem. (V teh podatki so nekateri partnerji, ki sodelujejo v več projektih oz. so uspešno kandidirali na obeh razpisih šteti kot partner v posameznem projektu). Animacija s strani LAS, je potekala v vseh treh občinah v enakovrednih deležih. Morda je razlog v predhodnih izkušnjah sodelovanja v tovrstnih projektih oz. samoiniciative deležnikov v posamezni občini.

Evalvacija rezultatov anketnih vprašalnikov


Na podlagi evalvacijskih vprašalnikov, ki smo jih pridobili s strani partnerjev projektov odobrenih na 1. javnem pozivu LAS s CILjem, so bili zbrani naslednji odgovori, rezultati in predlogi, na podlagi katerih se bo načrtovalo nadaljnje aktivnosti, ki bodo strmele k čim optimalnejšemu delovanju VP LAS s CILjem, izvajanju projektov in SLR.

IZVAJANJE OPERACIJ:

S kakšnimi težavami se partnerji največkrat soočajo pri izvajanju projektov? Kako so jih rešili?

- Iskanje ponudnikov oz. izvajalcev storitev.
- Obveščanje javnosti preko elektronskih in pisnih medijev (pravilno označevanje proj. aktivnosti).
- S tolmačenjem in upoštevanjem dokumentacije glede pravilnega izvajanja projektov - reševali s pomočjo VP LAS.
- Skrb ali bodo stroški, ki so nastali v projektu upravičeni ali ne.
- Zahtevna priprava zahtevkov, končnega poročila (kopiranje, skeniranje dokumentov).
- Izvajanje projekta na lastno odgovornost (zaradi dolgega čakanja na pogodbo s strani MGRT).
- Čakanje na odgovore s strani VP LAS (če je bilo odgovor potrebno pridobiti s strani MGRT).
- Neskladno podane informacije.
- Nepravilnost oddanih dokumentov po kontroli zahtevka.
- Zbiranje soglasij in potrdil.
- Spreminjanje navodil s strani MGRT.

VP LAS s CILjem si bo prizadeval, da upravičencem oz. partnerjem čim bolj poenostavi postopke – v kolikor je to mogoče, da bodo še vedno v skladu z merili pristojnih ministrstev (na nekatere postopke predpisane s strani ministrstev ni mogoče vplivati oz. se jih ne da poenostaviti). Prizadeval si bo ustrezno in natančno posredovanje informacij prijaviteljem in partnerjem. Poleg partnerjev ima tudi VP LAS s CILjem pogosto težave s tolmačenjem in spreminjanjem navodil s strani ministrstev (nejasna, neskladna navodila).

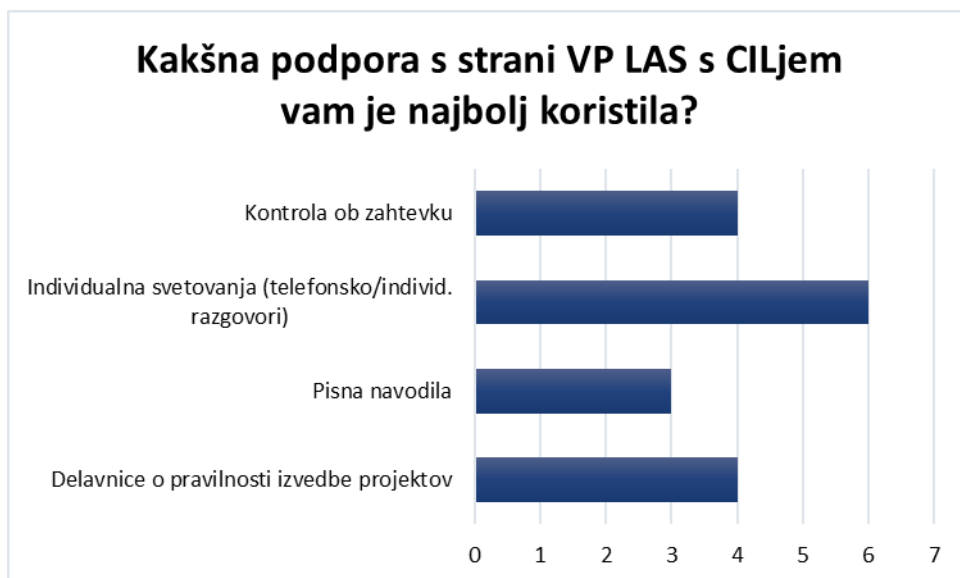


Partnerji so mnenja, da jim v času izvajanja projektov najbolj koristi podpora v obliki individualnih svetovanj. Poslužujejo pa se tudi drugih oblik podpore. Za prijavitelje iz 2.JP, se bo tako planiralo več individualnih svetovanj, posluževalo pa se bo tudi ostalih oblik podpore, ki so bile pozitivno sprejete pri partnerjih iz 1.JP.

Na katerem področju prijave oz. izvajanja operacije bi potrebovali več pomoči?

- Finančno ovrednotenje projekta ob prijavi.
- Pomoč pri pisanju prijavnice.
- Pri pripravi zahtevka

Prijaviteljem na 2. JP so bila do zaključka razpisa omogočena skupinska in individualna svetovanja. Ravno tako kot so bila izvedena izobraževanja na temo priprave zahtevkov v letu 2017 in 2018, se bodo nadaljevala izobraževanja na to temo v letu 2019. Poudarek bo na več individualnih svetovanjih.

Kakšno je dosedanje sodelovanje med vami in vodilnim partnerjem LAS (prijava na javni poziv, izvajanje operacije in priprava zahtevka, druge aktivnosti LAS)?



Partnerji ocenjujejo sodelovanje med njimi in VP LAS kot uspešnega/zelo uspešnega. V nadalje, si bo LAS prizadeval, da se uspešno sodelovanje ohrani oz. izboljša.

Navedite najbolj pozitivno in najbolj negativno stvar, ki jo lahko pripišete vodilnemu partnerju LAS s CILjem

(+)	(-)
Prizadeven VP LAS pri razlagi, posredovanju gradiva.	Dolgotrajnost postopkov - podpis pogodbe (z ministrstvom).
Možnost individualnega svetovanja oz. konzultacije.	Preveč papirologije.
Primerna pomoč.	Površnost pri pregledu zahtevka.
Odzivnost.	Časovnica, vedno se zelo mudi.


Negativne stvari na katere ima LAS vpliv, bo v prihodnje poskušal izboljšati, pozitivne pa ohraniti oz. nadgraditi.

Ali imate kakšna priporočila za vodilnega partnerja v povezavi z nadaljnjim delom in vodenjem LAS s CILjem?

- Več časa namenjenega konzultacijam pred prijavo projektov.
- Ohranitev individualnih svetovanj.

Priporočila partnerjev bo VP LAS implementiral v svojem nadaljnjem delovanju.

Ali se boste v prihodnje še odločili za izvajanje projektov v okviru SLR LAS s CILjem?




Če je odgovor ne, prosimo za kratko utemeljitev zakaj?

- Ker društvo temelji na prostovoljnem delu in je zelo težko pritegniti prostovoljce.
- Ker smo kot društvo premalo strokovno usposobljeni in nimamo prakse pri tovrstnih projektih.

Večina partnerjev se bo v prihodnje še odločilo za izvajanje projektov v okviru SLR LAS s Ciljem. Največ negativnih odgovorov je bilo podano s strani društev, ki se srečujejo s kadrovskimi omejitvami pri prijavi, izvajanju oz. vodenju tovrstnih projektov.

IZVAJANJE SLR LAS S CILJEM:

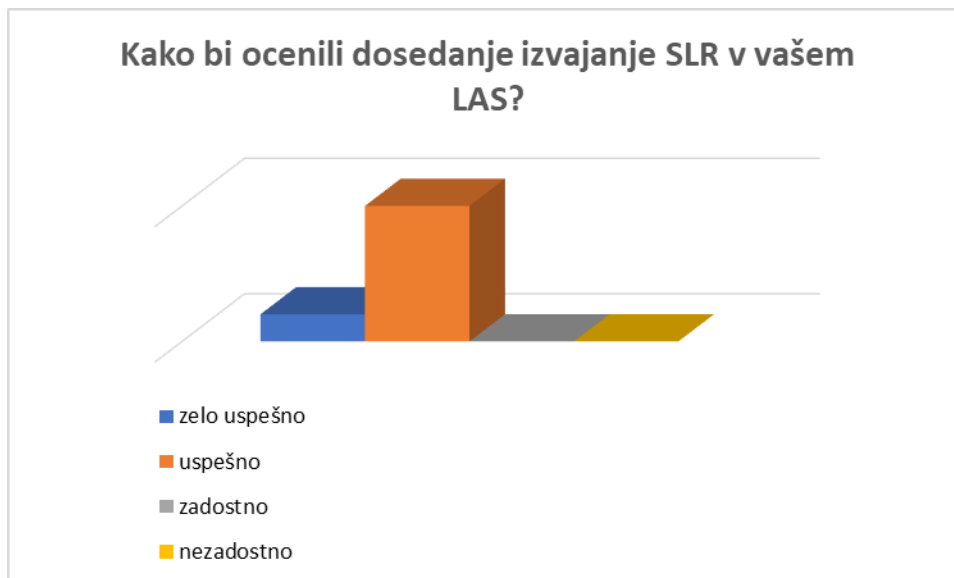


Če ste odgovor označili z zadostno ali nezadostno vas prosimo za kratko utemeljitev:

- Širša lokalna javnost ne pozna SLR in možnosti, ki jih imajo v okviru razpisov. Potreben razmislek o vključevanju različnih subjektov v skupnosti.

- Večina partnerjev ocenjuje izvajanje SLR kot uspešno. Podan je bil pomislek o dodatnem vključevanju različnih subjektov v izvajanje projektov in SLR.

Katera orodja so po vašem mnenju najbolj učinkovita za seznanitev potencialnih upravičencev s SLR in možnostmi financiranja projektov?

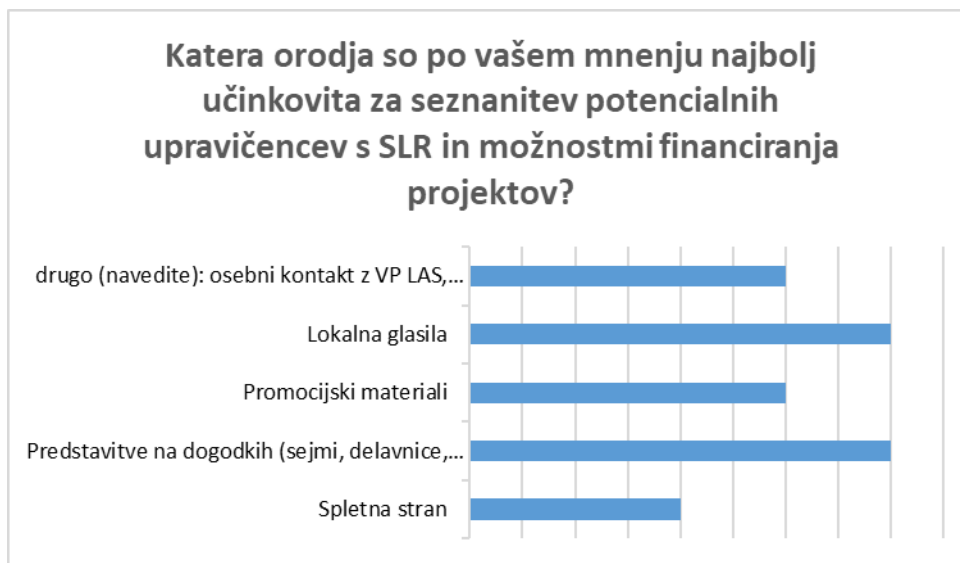

Partnerji so mnenja, da so najučinkovitejši načini seznanitve javnosti z SLR LAS s CILjem in možnostmi financiranja projektov preko lokalnih glasil in predstavitvenih dogodkov. Vse aktivnosti, ki jih je LAS že sedaj izvajal, se namerava nadaljevati oz. jih okrepiti.

Katere pomanjkljivosti pri izvajanju SLR prepoznate in jih je po vašem mnenju možno odpraviti?


- Predhodni pregled zahtevka v elektronski obliki, da se dokumentov ne popravlja in tiska večkrat.
- Preveč birokracije. Potrebno poenostaviti postopke (predvsem pri povpraševanju in iskanju ponudb).

VP LAS s CILjem bo strmel k poenostavitvi postopkov kjer je mogoče (ni omejitev oz. drugače predpisano s strani pristojnih ministrstev).

Ali so po vašem mnenju razpoložljiva finančna sredstva za izvajanje operacij v okviru posameznega razpisanega ukrepa iz 1. in 2. JP LAS s CILjem zadostna za doseganje ciljev SLR?



Na katerem tematskem področju oz. cilju iz SLR bi si želeli več sredstev (označite tudi cilj)?

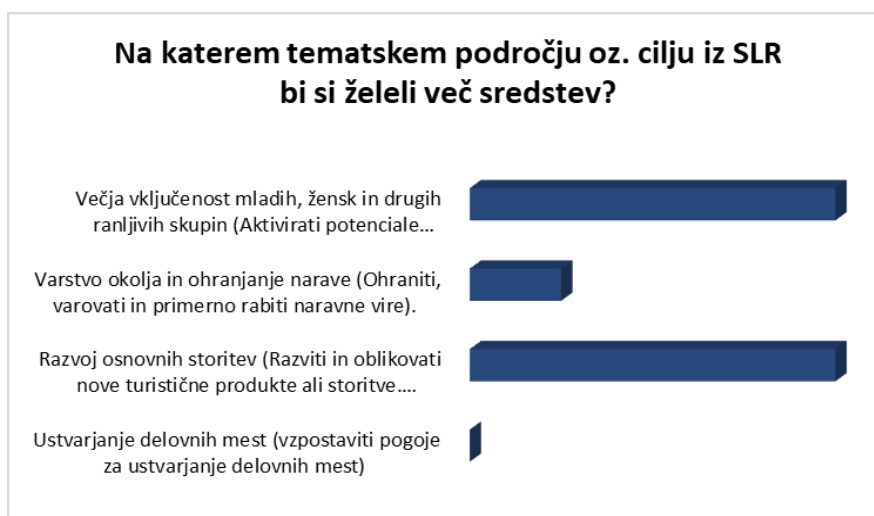

Partnerji bi si glede na odgovore želeli več sredstev na tematskih področjih Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ter Razvoju osnovnih storitev. Zanimanja ne kažejo za tematsko področje ustvarjanje delovnih mest. Na podlagi animacijskih delavnic za širšo javnost na območju LAS, se bo preverilo želje in potrebe območja, na podlagi katerih se bo predlagalo spremembo SLR LAS s CILjem pristojnima ministrstvom.

Povzetek evalvacije izvedbe SLR LAS s Ciljem

Črpanje sredstev: Razlike v predvideni dinamiki črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih in razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja, se razlikuje od dejanskega stanja predvsem zaradi zamika izvajanja programa in črpanja sredstev na ravni države. LAS je bil do sedaj uspešen pri črpanju sredstev (V skladu s pogodbami oz. odločbami so bili na pristojno ministrstvo posredovalni vsi vmesni ali končni zahtevki. Do sedaj ni bilo neupravičenih stroškov v oddanih zahtevkih).

Izvedba javnih pozivov: v letu 2016 in 2018, sta bila objavljena javna poziva LAS s CILjem, na katera je prispelo 30 vlog. Na ukrepu Razvoj novih turističnih produktov in storitev, je glede na prijave zmanjkalo sredstev. Veliko zanimanja je bilo tudi na ukrepu ohranjanje in oživljanje dediščine območja in Aktivaciji potencialov ranljivih skupin. Vsa razpisana sredstva so ostala neporabljena na ukrepih Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov iz ESRR sklada. Iz obeh pozivov, je ostalo skupaj 380.702,88 EUR ne dodeljenih sredstev. Na podlagi rezultatov animacijskih delavnic na območju, se bo odločilo kaj storiti s preostankom ne dodeljenih sredstev (prenos sredstev med posameznimi ukrepi, objava novega JP, priprava projektov LAS,..).

Doseganje zastavljenih kazalnikov in mejnikov do 31. 12. 2018:

Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2018 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki oz. mejniki potrjeni v SLR. LAS mora do decembra 2023 doseči vse zastavljene kazalnike v SLR LAS s CILjem.

Specifične teme vrednotenja JP LAS s Ciljem:

V sklopu izdelave vrednotenja, se je evalviralo tudi specifične teme: število podprtih partnerstev, število deležnikov vključenih v izvajanje projektov, strukturo upravičencev po sektorjih in teritorialno pokritost. Rezultati evalvacije, ki so nastali na podlagi pridobljenih podatkov iz 1. in 2. JP LAS s Ciljem, kažejo, da bo največ projektov izvedenih iz EKSRP sklada (v okviru SLR je predvidenih tudi več sredstev), v katerih bo sodelovalo tudi največ deležnikov. Med upravičenci jih največ izhaja iz javnega sektorja (kadrovske kapacitete s predznanjem izvajanja projektov). Največ partnerjev projektov izhaja iz občine Idrija, sledi občina Logatec in nato iz Občine Cerklje ob noči. V projektih sodelujejo tudi trije partnerji, ki imajo sedež v Ljubljani, delujejo pa na območju LAS s CILjem.

Delovanje VP LAS s CILjem in izvajanje SLR:

Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov je VP LAS s CILjem pridobil objektivno oceno svojega delovanja in izvajanja SLR, na podlagi katere bo ohranil oz. nadgradil pozitivne in poskušal popraviti, izboljšati negativne prakse.
