

Naknadno vrednotenje SLR LAS s CILjem za programsko obdobje 2014-2020

Idrija, januar-marec 2024

V programskem obdobju 2014-2020, sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija lokalnega razvoja. Za potrebe spremljanja in vrednotenja SLR LAS s CILjem je vodilni partner LAS s CILjem izdelal načrt vrednotenja, ki omogoča učinkovito spremljanje in vrednotenje skozi celotno programsko obdobje. Aktivnosti vrednotenja v programskem obdobju 2014-2020, so bile razdeljene na:

Spremljanje in analizo izvedenih operacij (projektov)

Pri vsaki operaciji se preveri doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov operacije.

Letno spremljanje, analiza ciljev in kazalnikov SLR

Spremljanje je neprekinjen proces preverjanja vsebine programa in doseganja ciljnih parametrov, ki se izvaja z namenom, da se prilagodijo vsa morebitna odstopanja od opredeljenih ciljev Strategije. LAS (vodilni partner) je letno izvedel aktivnosti spremljanja, s katerimi je pridobil podatke, ki jih navajajo smernice SLR za poročanje o doseženih ciljnih SLR. Poleg tega spremljanje SLR prispeva k večji odgovornosti porabe javnih sredstev in zagotavljanju podatkov za vrednotenje SLR.

Vmesno vrednotenje SLR

Z vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij oz. programov, ugotovimo, v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Za vrednotenje so zelo pomembni podatki, pridobljeni s spremljanjem SLR. Vrednotilo se je obvezne kazalnike na ravni CLLD za EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni LAS s CILjem. Vmesno vrednotenje, pri katerem se je preverjalo relevantnost ciljev, vključenost prebivalstva in delovanje partnerstev, je bilo izvedeno leta 2019 in 2021.

Naknadno vrednotenje SLR

Z naknadnem vrednotenjem se želi objektivno ugotoviti, ali je SLR dosegla zastavljene cilje in učinke. Namenjeno je tudi ugotovitvam o glavnih dejavnikih odstopanj ter oceni vpliva Strategije na vključeno območje.

Dejavnost	Časovna opredelitev
Spremljanje izvedenih operacij	Po zaključeni operaciji, po potrebi v času izvajanja operacije
Letno spremljanje SLR	Vsako leto za obdobje do 31. decembra, poročanje do 31. marca (2016 ni obveznosti poročanja)
Vmesno vrednotenje SLR	Za obdobje do 31. 12. 2018, poročanje do 31. 03. 2019 Za obdobje do 31. 12. 2020, poročanje do 31. 03. 2021
Naknadno vrednotenje SLR	Za obdobje do 31. 12. 2023, poročanje do 31. 03. 2024

Vodilni partner je v skladu s predvidenimi aktivnostmi spremljanja in vrednotenja izvedel spremljanje izvedenih operacij, letno spremljanje SLR in dve vmesni vrednotenji SLR. Ob zaključku programskega obdobja je tako potrebno izvesti še naknadno vrednotenje SLR s katerim se ugotavlja doseganje zastavljenih ciljev in vpliv SLR na vključeno območje.

Finančni načrt Izvajanje SLR LAS s CILjem:

Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih:

Podukrep	Sklad	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (predvidoma)	2025 (predvidoma)	Skupaj
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost	EKSRP	0 EUR	0 EUR	0 EUR	19.782,62 EUR	70.440,84 EUR	435.453,22 EUR	141.510,95 EUR	157.676,33 EUR		49.253,61 EUR	874.117,57 EUR
	ESRR	0 EUR	0 EUR	136.094,84 EUR	84.278,61 EUR	60.518,13 EUR	71.328,63 EUR	86.517,33 EUR	162.088,46 EUR	/	/	600.826,00 EUR
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine	EKSRP	0 EUR	0 EUR	0 EUR	V skladu z razpisom	V skladu z razpisom	V skladu z razpisom	V skladu z razpisom	V skladu z razpisom	/	/	
	ESRR	0 EUR	0 EUR	7.000,00 EUR	0 EUR	36.999,89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	/	/	43.999,89 EUR
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije	EKSRP	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000,00 EUR	32.979,87 EUR	5.000,00 EUR	47.979,87 EUR
	ESRR	0 EUR	48.829,89 EUR	50.059,39 EUR	49.995,77 EUR	49.446,02 EUR	50.559,63 EUR	50.210,66 EUR	32.654,64 EUR	/	/	331.756,00 EUR
Skupaj		0 EUR	48.829,89 EUR	193.154,23 EUR	154.057,00 EUR	217.404,88 EUR	557.341,48 EUR	278.238,94 EUR	362.419,43 EUR	32.979,87 EUR	54.253,61 EUR	1.898.679,33 EUR

Razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja po letih (za podukrepa Podpora z izvajanje operacij v okviru SLR in priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS):

Tematsko področje	Sklad	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ustvarjanje delovnih mest	EKSRP	0	0	0,00	0,00	0,00	39.028,72	0	0		49.253,61
	ESRR	0	0,00	77.883,01	67.915,71	60.518,13	71.328,63	86.517,33	162.088,46	/	/
Razvoj osnovnih storitev	EKSRP	0	0		19.782,62	55.009,22	197.783,72	0,00	39.454,71		
Varstvo okolja in ohranjanje narave	EKSRP	0	0	0	0	15.431,62	86.548,68	27.869,69	31.492,58		
	ESRR	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/
Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	EKSRP	0	0	0	0	0	112.092,10	113.641,26	86.729,04		
		0	0	58.211,83	16.362,90	0	0	0	0	/	/
Skupaj		0	0	136.094,84	104.061,23	130.958,97	506.781,85	228.028,28	319.764,79	0,00	49.253,61

Podukrep: Pripravljalna podpora namenjena za aktivnosti izdelave SLR, je bila s strani ministrstev izplačana v letu 2017.

Podukrep: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Za projekte sodelovanja LAS je LAS s CILjem namenil 44.000 EUR iz sredstev za izvajanje SLR (ESRR sklad) za projekta Zgodbe rok in krajev in Pot miru - Dediščina prve svetovne vojne. Na razpisih MKGP za projekte sodelovanja je LAS s CILjem pridobil še dodatnih 887.571,06 EUR. Izvajali so se naslednji projekti sodelovanja LAS: Novi izzivi slovenske drobnice, Odprta vrata kmetij, Domače in umetnostne obrti-dediščina in sodobnost, Digitalne rešitve za izzive podeželja, E-nostavno na kolo, Centri interpretacije zavarovanih območij, Roko-delci, PRO-EKO, Med-o-vita, Manj je več, Prehod na sonaravno oskrbo s hrano.

Podukrep: Podpora za tekoče stroške in animacijo

Vodilni partner LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija v skladu z finančnim planom in letnim načrtom aktivnosti izvaja vodenje in delovanje LAS s CILjem. LAS v skladu s predvidenim planom vlaga zahtevke za tekoče stroške in stroške animacije. Kvota sredstev za podukrep je določena v SLR LAS s CILjem.

Podukrep: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Operacije LAS s CILjem:

Operacije, ki jih izvaja LAS s CILjem, so bile pripravljene in izvedene v sodelovanju z občinami (Cerkno, Idrija, Logatec) in zainteresirani člani LAS. Operacije so bile pripravljene na podlagi potreb območja, ki so se izkazale ob pripravi in izvajanju SLR LAS s CILjem (vključevaje ranljivih skupin, trženje lokalnih produktov, vzpostavitev coworkingov, vzpostavljanje boljših pogojev za razvoj podjetništva,.).

V letu 2017 so se izvajale tri operacije LAS s Ciljem (Formica Cerkno – Idrija – Logatec, Dobimo se na tržnici in Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem), ki jih je koordinirala ICRA d.o.o. Idrija. Vse tri operacije so bile sofinancirane iz ESRR sklada. V letu 2018 se je na MGRT prijavilo in tudi začelo izvajati operaciji Formica 2 in Dobimo se na tržnici 2, ki sta po aktivnostih predstavljali nadaljevanje predhodnih operacij in sta imeli kot zastavljena kazalnika vzpostavitev dveh delovnih mest. V letu 2019 sta se poleg Formica 2 in Dobimo se na tržnici 2, izvajala tudi projekta Formica 3 Cerkno – Idrija - Logatec in Dobimo se na tržnici 3, ki sta se nadaljevala tudi v letu 2020. V letu 2020 so se začele izvajati operacije iz EKSRR sklada: Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, Naokoli, Krepitev skupnosti, ter operaciji iz ESRR sklada: Formica 4 Cerkno-Idrija - Logatec in Dobimo se na tržnici 4 (ESRR sklad). V letu 2022 in 2023 se je izvajal projekt Formica 5. Kot zadnji izmed

projektov LAS se izvaja projekt Skupaj za več znanja (EKSRP sklad), ki se bo zaključil v letu 2025.

Operacije izbrane na javnem pozivu LAS s CILjem:

1. javni poziv LAS s CILjem je bil objavljen 29. 12. 2016 in zaključen 15. 2. 2017. Za oba sklada je bilo razpisanih 404.708,47 EUR. Na javni poziv je bilo prijavljenih 16 operacij. Tri za ESRR sklad in 13 za EKSRP sklad. Dve vlogi sta bili s strani ocenjevalne komisije zavrženi. Skupna zaprošena vrednost vseh prijavljenih operacij je znašala 321.305,60 EUR. Od tega je bilo zaprošenih sredstev za ESRR sklad v skupni vrednosti 256.145,35 EUR, za EKSRP sklad pa 65.160,25 EUR.

Za EKSRP sklad je bilo najmanj zaprošenih sredstev na ukrepih Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov in Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest. Na ukrepih Razvoj novih turističnih produktov in storitev ter Ohranjanje in oživljanje dediščine območja, pa je bila višina zaprošenih sredstev višja od višine razpisanih sredstev.

Za ESRR sklad je bilo najmanj projektnih prijav na ukrepu Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest, največ pa na ukrepu Aktivacija potencialov ranljivih skupin, kjer je bila višina zaprošenih sredstev višja od višine razpisanih sredstev.

S strani pristojnih ministrstev so bili iz ESRR sklada potrjeni trije projekti. Iz EKSRP sklada, pa sta bila potrjena dva projekta.

2. javni poziv LAS s CILjem je bil objavljen 31. 8. 2018 in zaključen 2. 11. 2018. V 2. javnem pozivu, je bilo za oba sklada razpisanih 769.310,00 EUR. Na javni poziv je bilo prijavljenih 14 operacij. Od tega je prispela ena operacija za sofinanciranje iz ESRR sklada, ostalih 13 pa za sofinanciranje iz EKSRP sklada. Pri EKSRP skladu je bila ena vloga s stani ocenjevalne komisije zavržena, ena pa ni dosegla dovolj točk za sofinanciranje, tako da je bilo za sofinanciranje izbranih 12 projektov (11 iz EKSRP in 1 iz ESRR sklada).

Za EKSRP sklad so v celoti ostala nepokorščina sredstva na ukrepu Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. Sredstva so ostala tudi na drugih ukrepih, razen ukrepu Razvoj novih turističnih produktov in storitev, kjer je zmanjkalo sredstev za realizacijo vseh projektnih aktivnosti.

Pri ESRR skladu je bila prijavljena operacija sofinancirana iz ukrepa Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest, na ostalih razpisanih ukrepih pa ni bilo prijav, tako da so sredstva ostala neporabljena.

Iz ostanka sredstev se je oblikovalo operacije LAS, ki so sledile potrebam območja in zagotovile doseganje zastavljenih kazalnikov SLR.

Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za ESRR sklad (1. in 2. JP LAS s CILjem)

Tematsko področje	Ukrepi	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 1. JP	Višina zaprošenih sredstev 1. JP	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 2. JP	Višina zaprošenih sredstev 2. JP
USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest	108.222,06 EUR	27.320,62 EUR	76.998,00 EUR	25.276,21 EUR
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	Aktivacija potencialov ranljivih skupin	36.617,81 EUR	37.839,63 EUR	16.543,00 EUR	0
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov	0	0	25.137,00 EUR	0
Skupaj (sklad ESRR)		144.839,87 EUR	65.160,25 EUR	118.679,00 EUR	25.276,21 EUR

Ostanek sredstev na ESRR skladu 93.401,79 EUR.

Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za EKSRP sklad (1. in 2. JP)

Tematsko področje	Ukrepi	Višina razpisanih nepovratnih sredstev	Višina zaprošenih sredstev 1. JP	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 2. JP	Višina zaprošenih sredstev 2. JP
USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest	52.789,50 EUR	29.305,96 EUR	245.152,00 EUR	39.998,80 EUR
RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV	Razvoj novih turističnih produktov in storitev	55.942,01 EUR	58.072,64 EUR	92.091,00 EUR	108.784,76 EUR
	Ohranjanje in oživljanje dediščine območja	58.637,04 EUR	59.906,01 EUR	114.579,00 EUR	89.351,44 EUR
	Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju	0 EUR	0 EUR	30.804,00 EUR	0 EUR
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov	92.500,05 EUR	10.754,69 EUR	109.613,00 EUR	74.127,25 EUR
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	Aktivacija potencialov ranljivih skupin	0 EUR	0 EUR	58.392,00 EUR	51.067,66 EUR
Skupaj (sklad EKSRP)		259.868,60 EUR	158.039,30 EUR	650.631,00 EUR	363.329,91 EUR

Ostanek sredstev na EKSRP skladu 287.301,09 EUR

Skupaj ostanek sredstev iz ESRR in EKSRP sklada: 380.702,88 EUR.

Skupaj višina razpisanih in zaprošenih sredstev

Tematsko področje	Ukrepi	Sklad	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 1 in 2 JP	Višina zaprošenih sredstev 1 in 2 JP	Ostanek sredstev po ukrepih
USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest	ESRR	185.220,06 EUR	52.596,83 EUR	132.623,23 EUR
		EKSRP	297.941,50 EUR	69.304,76 EUR	228.636,74 EUR
RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV	Razvoj novih turističnih produktov in storitev	EKSRP	148.033,01 EUR	166.857,40 EUR	-18.824,39 EUR
	Ohranjanje in oživljanje dediščine območja	EKSRP	173.216,04 EUR	149.257,45 EUR	23.958,59 EUR
	Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju	EKSRP	30.804,00 EUR	0,00 EUR	30.804,00 EUR
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov	ESRR	25.137,00 EUR	0,00 EUR	25.137,00 EUR
		EKSRP	202.113,05 EUR	84.881,94 EUR	117.231,11 EUR
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN	Aktivacija potencialov ranljivih skupin	ESRR	53.160,81 EUR	37.839,63 EUR	15.321,18 EUR
		EKSRP	58.392,00 EUR	51.067,66 EUR	7.324,34 EUR
Skupaj nepovratnih sredstev (ESRR in EKSRP)			1.174.017,47 EUR	611.805,67 EUR	

Analiza javnih razpisov LAS s Ciljem

Število podprtih partnerstev (projektov iz 1. JP): 5


EKSRRP sklad: Franja nas povezuje, G(r)ozd za prihodnost.

ESRR sklad: Startup! Idrija – Cerčno, Aktivirajmo se, Povezovanje urbanih naselij občine Logatec.

Število podprtih partnerstev (projektov iz 2. JP): 12


EKSRRP sklad: i-DenDI, Odkrijmo žgalnice, MC Mobil, E-KOLOško KOLOvratenje, Krovna destinacijska znamka Idrija, Gartlc, Kulturna dediščina kot poslovna priložnost, Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH - II), Sestavljamo čisto okolje Občine Logatec, Prijazni do okolja (lokalno z manj odpadki), Medeni krog.

ESRR sklad: Zmanjšaj!

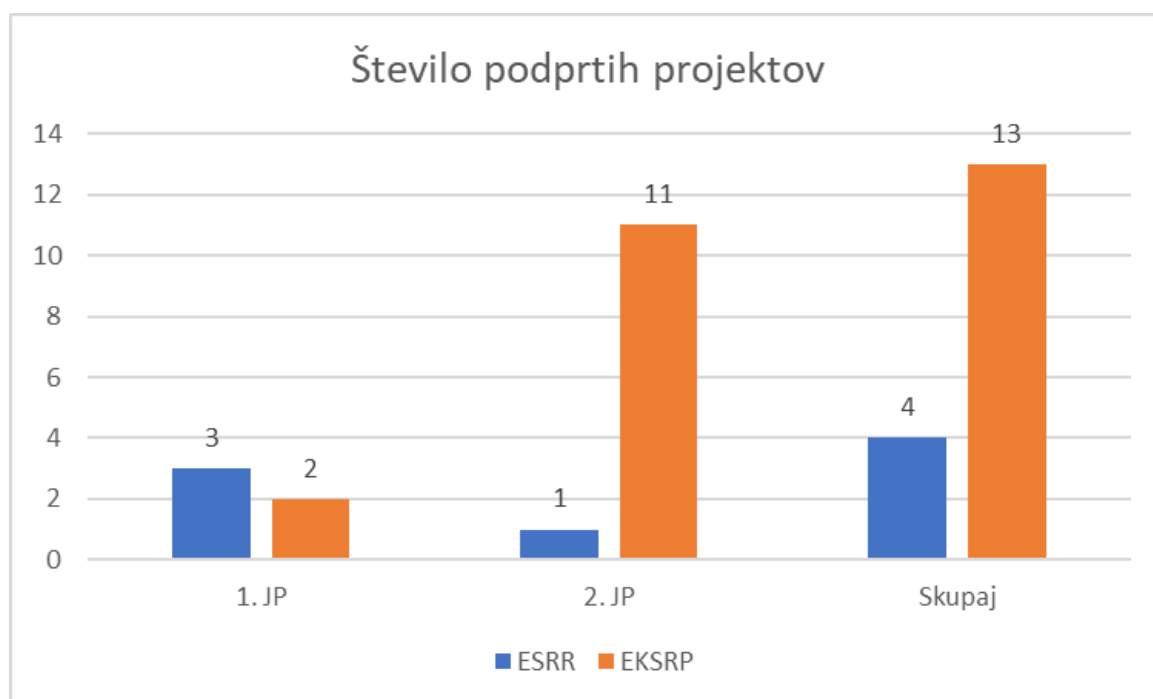


Več prijav s strani prijaviteljev je bilo na kmetijskem skladu (razpisanih tudi več sredstev). Na 1. JP je bilo za EKSRRP prijavljenih 13 projektov a so kasneje partnerji odstopili, tako da je ARSKTRP odločala o potrditvi dveh projektov. Na 2. JP je bilo iz EKSRRP sklada izbranih in potrjenih 11 projektov.

Število deležnikov (partnerjev) vključenih v izvajanje operacij

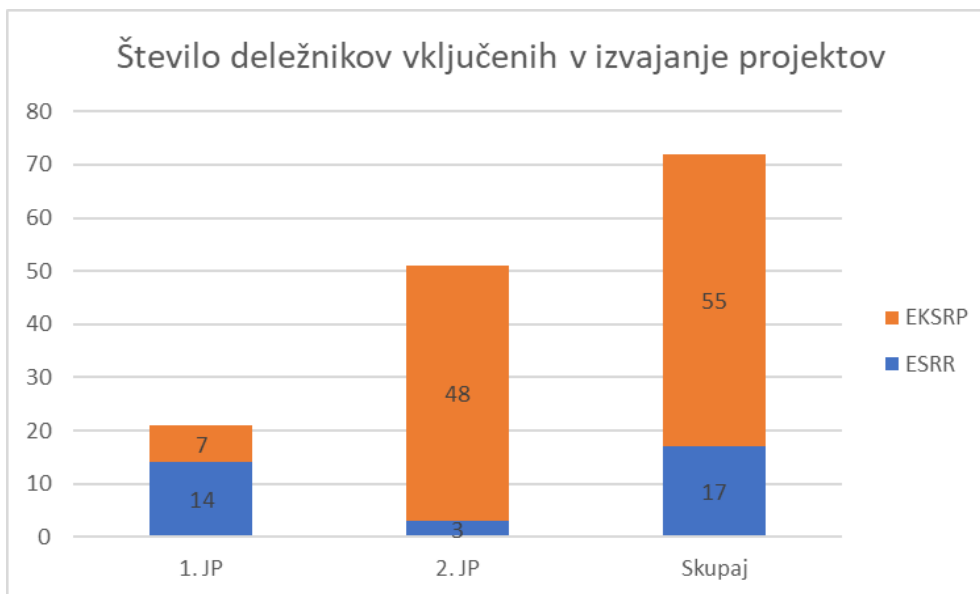

V projektih iz obeh razpisov je sodelovalo 72 partnerjev. Od tega jih je bilo 55 vključenih v projekte iz EKSRRP sklada, 17 pa iz ESRR sklada. Nekateri partnerji so sodelovali v več projektih in so v zbranih podatkih šteti večkrat (kot partner v posameznem projektu).


Struktura upravičencev potrjenih na javnih pozivih

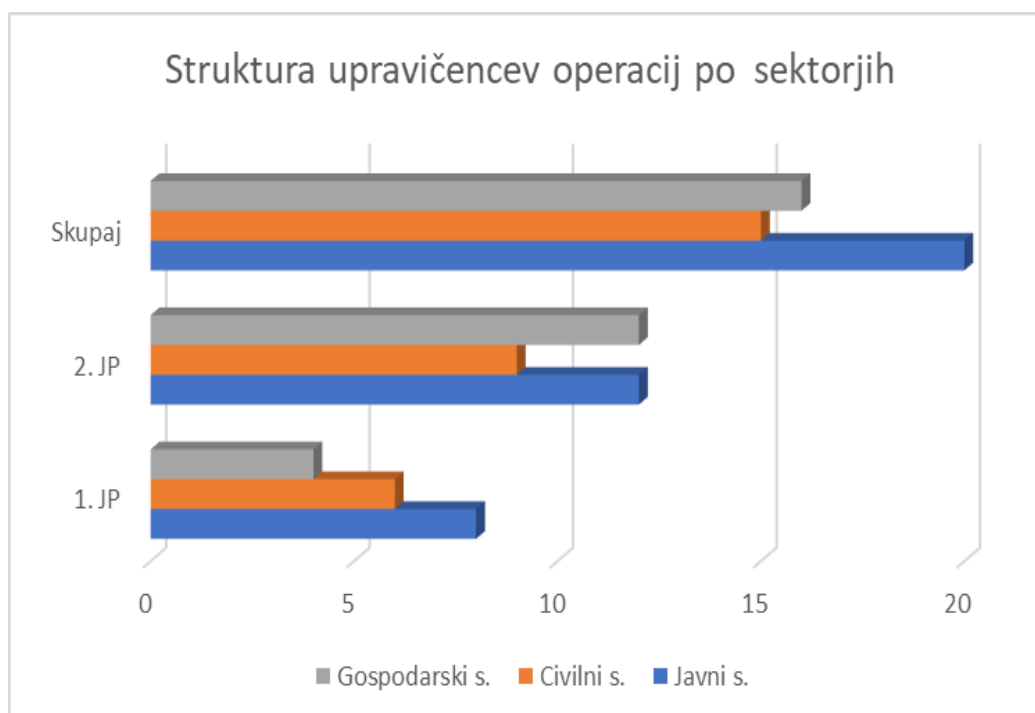

Največ upravičencev posameznih projektov izhaja iz javnega sektorja (20), sledi gospodarski sektor (16) in nato civilni sektor (15). VP LAS s CILjem je vsem sektorjem omogočil

enakovredno obravnavo (svetovanja). Razlog, da kot partner v projektih prevladuje javni sektor je najverjetneje v razpoložljivi kadrovske kapaciteti, ki ima tudi izkušnje s prijavi oz. sodelovanjem v tovrstnih projektih.

Teritorialna pokritost – lokacije partnerjev v projektih

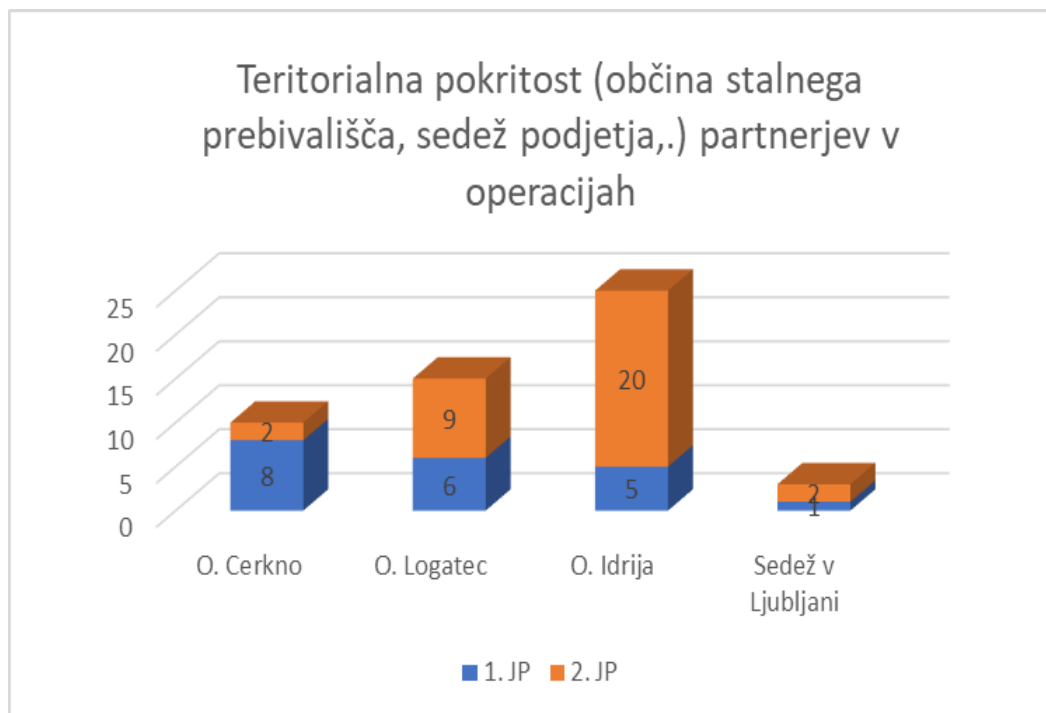

Največ partnerjev projektov izhaja iz občine Idrija (25), sledi občina Logatec (15), 10 iz Občine Cerčno ter 3 partnerji, ki imajo sedež v Ljubljani, delujejo pa na območju LAS s CILjem. (V teh podatki so nekateri partnerji, ki sodelujejo v več projektih oz. so uspešno kandidirali na obeh razpisih šteti kot partner v posameznem projektu). Animacija s strani LAS, je potekala v vseh treh občinah v enakovrednih deležih. Morda je razlog v predhodnih izkušnjah sodelovanja v tovrstnih projektih oz. samoiniciative deležnikov v posamezni občini.

Evalvacija rezultatov anketnih vprašalnikov

Na podlagi evalvacijskih vprašalnikov, ki smo jih pridobili s strani partnerjev projektov odobrenih na 2. javnem pozivu LAS s CILjem in projektov sodelovanja LAS ter projektov LAS, so bili zbrani odgovori, rezultati in predlogi, na podlagi katerih se je načrtovalo nadaljnje aktivnosti, ki so zagotavljale čim optimalnejše delovanje VP LAS s CILjem, izvajanje projektov in SLR. Na vprašanja so odgovarjali tako upravičenci, ki so že zaključili s projekti, kot tudi upravičenci med izvajanjem projekta. Rezultate ankete predstavljamo ločeno.

IZVAJANJE OPERACIJ:

Vodilni partner LAS s CILjem si prizadeva in si bo še naprej prizadeval, da upravičencem oz. partnerjem čim bolj poenostavi postopke (priprave, izvajanja in poročanja) v kolikor je to mogoče, da bodo še vedno v skladu z merili pristojnih ministrstev (na nekatere postopke predpisane s strani ministrstev ni mogoče vplivati oz. se jih ne da poenostaviti). Prizadeval si bo za ustrezno in natančno posredovanje informacij prijaviteljem in partnerjem.

Izvedli smo anketo med upravičenci, ki so že zaključili z izvajanjem projekta in anketo med upravičenci, ki projekte še izvajajo. Glede na nekoliko različne vsebine, se tudi anketi ponekod med seboj razlikujeta. Rezultate obeh anket predstavljamo v nadaljevanju. Kjer je mogoče smo rezultate pripravili primerjalno.

- Kako vam koristi podpora s strani VP LAS s CILjem?

Med izvajanjem projekta	nič	malo	zelo	najbolj
Delavnice o pravilnosti izvedbe projektov	1	1	3	6
Pisna navodila	0	2	3	6
Individualna svetovanja (telefonsko/individ. razgovori)	0	1	2	8
Kontrola ob zahtevku	1	1	4	5
drugo	0	0	0	0

Ob zaključku izvajanja projekta	nič	malo	zelo	najbolj
Delavnice o pravilnosti izvedbe projektov	3	0	10	5
Pisna navodila	0	0	15	3
Individualna svetovanja (telefonsko/individ. razgovori)	0	0	6	12
Kontrola ob zahtevku	0	1	8	8
drugo	0	0	0	0

- Več pomoči bi potrebovali pri:

Med izvajanjem projekta	Da	Ne	To ni v pristojnosti LAS
Označevanja in uporabe pravih znakov	5	6	0
Informiranja o pravočasni izvedbi aktivnosti	5	6	0
Izvajanja ZJN3	2	5	4
Pri izpolnjevanju zakonodaje, ki ni vezana na LAS	1	4	6
Pri zagotavljanju ustreznosti pogojev v okviru LAS	5	4	1
Pri finančnih in računovodskih zadevah	5	3	3
Pri pripravi poročila	6	5	0
Pri promociji projekta	7	4	0
Drugo:	0	0	0

Ob zaključku izvajanja projekta	Da	Ne	To ni v pristojnosti LAS
Označevanja in uporabe pravih znakov	6	12	0
Informiranja o pravočasni izvedbi aktivnosti	2	16	0
Izvajanja ZJN3	4	11	3
Pri izpolnjevanju zakonodaje, ki ni vezana na LAS	1	11	6
Pri zagotavljanju ustreznosti pogojev v okviru LAS	5	10	0
Pri finančnih in računovodskih zadevah	2	13	3
Pri pripravi poročila	3	13	2
Pri promociji projekta	8	9	0
Drugo:	0	0	0

- Kakšno je vaše dosedanje sodelovanje z vodilnim partnerjem LAS

Med izvajanjem projekta	Nezadostno	Zadostno	Uspešno	Zelo uspešno
Prijava na javni poziv	0	1	3	6
Izvajanje operacije	0	1	3	6
Oddaja zahtevka	0	1	1	7

Ena opomba: Želeli bi več pomoči in razlage glede morebitnih sprememb in posebnosti, sploh v času epidemije.

Ob zaključku izvajanja projekta	Nezadostno	Zadostno	Uspešno	Zelo uspešno
Prijava na javni poziv	0	0	5	13
Izvajanje operacije	0	0	7	11
Priprava zahtevka	0	0	7	11

- Ocenite dosedanjo učinkovitost in uspešnost izvajanja operacije

Med izvajanjem projekta	neuspešno	manj uspešno	uspešno	zelo uspešno
Učinkovitost partnerstva	0	0	10	1
Uspešnost izvajanja aktivnosti	0	1	10	0

- Katera orodja so po vašem mnenju najbolj učinkovita za seznanitev potencialnih upravičencev s SLR in možnostmi financiranja projektov

Med izvajanjem projekta	Frekvenca
Spletna stran	1
Predstavitve na dogodkih (sejmi, delavnice, tržnice)	5
Promocijski material	0
Lokalna glasila	0
Drugo	5 – kombinacija vsega naštetega

Po zaključku projekta	Frekvenca
Spletna stran	3
Predstavitve na dogodkih (sejmi, delavnice, tržnice)	4
Promocijski material	0
Lokalna glasila	1
Drugo	4 – predstavitvene delavnice z deležniki, spletna stran, lokalni mediji 3- kombinacija vseh načinov 1-Občinske spletne strani, občinske novice, lokalni radio 1-Lokalna radijska postaja 1-loaklna radijska postaja, občinska spletna stran in objava v občinskih novicah

- Priporočila in mnenja upravičencev v času izvajanja projektov:
 - Podkrepiti informiranje deležnikov, komuniciranje s potencialnimi deležniki na celotnem območju LAS s CILjem.
 - Vrednotenje in evlavacija izvedenih projektov in rezultatov, usmerjeno načrtovanje vsebin glede na podlage/izvedene projekte – nadaljevanje dela.
 - Možnost izvajanja večjih investicijskih projektov.

- Ob koncu projekta so upravičenci navedli najbolj pozitivno ter najbolj negativno stvar, ki so jo pripisali vodilnemu partnerju.

Pozitivne:

- Odzivnost in osebno svetovanje kadarkoli je bilo potrebno (10)
- Sodelovanje pri prijavi na MGRT in urejanju dokumentacije (1)
- Hitra in učinkovita pomoč (2)
- Pomoč in sodelovanje pri usklajevanju (2)
- Informacije in nasveti (1)
- Delavnice (1)

Negativne:

- Spletna stran (2)
- Da LAS sam odpravi napako pri oddaji zahtevka in tega ne sporči upravičencu (3)
- Distanciranje od izvedbe projekta, projekt je morala samostojno izvati vodja projekta (1)

- Priporočila za vodilnega partnerja LAS s CILjem (po zaključku projekta):

- Manj papirnatega poslovanja, če je mogoče.
- Prenova spletne strani.
- Možnost preverjanja sprememb projekta v aplikaciji pred oddajo zahtevka.
- Usklajena FB promocija za različne projekte.

Po zaključku projekta	Ali se boste v prihodnje še odločili za izvajanje projektov v okviru SLR LAS s CILjem
Da	18
Ne, ker...	0

Po zaključku projekta	Kako bi ocenili dosedsanje izvajanje SLR v vašem LAS
Zelo uspešno	9
Uspešno	9
Zadostno	0
Nezadostno	0

Po zaključku projekta	Ali so po vašem mnenju razpoložljiva finančna sredstva za izvajanje operacij v okviru posameznega razpisanega ukrepa iz. 1. in 2. javnega poziva zadostna za doseganje ciljev iz SLR?
Da	5
Ne	4
Ne vem/relativno	9

- Upravičenci so ob zaključku izvajanja projekta navedli naslednje pomanjkljivosti pri izvajanju SLR ter predlagali rešitve:
 - Prilagajanje SLR razmeram in spremembam v okolju.
 - Pomanjkljiva promocija in informiranje o projektih. Vrednotenje in evalvacija izvedenih projektov in vsebin.
 - Večji fokus na večje investicijske projekte, za kar bi morali drugače zastaviti strategijo v novem programskem obdobju. Obdržati manjše projekte, na katere bi se prijavljala društva
- Upravičence že zaključenih projektov smo vprašali tudi o tem na katerem tematskem področju bi želeli več sredstev

Po zaključku projekta		Na katerem tematskem področju oz. cilju iz SLR bi si želeli več sredstev ?
Da 13	Ne 1	Ustvarjanje delovnih mest (vzpostaviti pogoje zaustvarjanje delovnih mest)
Da 16	Ne 2	Razvoj osnovnih storitev (Razviti in oblikovati noveturistične produkte ali storitve. Ohraniti in oživiti dediščinoobmočja. Izboljšati kakovost življenja na podeželju).
Da 13	Ne 2	Varstvo okolja in ohranjanje narave (Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire).
Da 8	Ne 5	Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin(Aktivirati potenciale ranljivih skupin).

Število izvedenih projektov in višina izplačanih zahtevkov do leta 2023 glede na celotno višino sredstev za podukrep 19.2 in 19.3 (ESRR sklad)

Število izvedenih projektov po skladih in vrstah ukrepov v programskem obdobju 2014-2020:

	ESRR sklad	EKSRP sklad	
Projekti LAS	10	4	14
Projekti sodelovanja LAS	2	11	13
Projekti potrjeni na 1. javnem pozivu LAS s Ciljem	3	2	5
Projekti potrjeni na 2. javnem pozivu LAS s Ciljem	1	11	12
Skupaj	16	28	44

Višina izplačanih sredstev glede na potrjena sredstva SLR

	ESRR sklad	EKSRP sklad
Višina sredstev v potrjeni SLR (podukrep 19.2. in 19.3- samo ESRR sklad)	644.825,89 €	874.117,57 €
Višina izplačanih sredstev do konca leta 2023	644.567,80 €	822.747,07 €

V letu 2023 so se zaključili vsi projekti iz ESRR sklada in bili izplačani vsi zahtevki. LAS in upravičenci operacij so bili pri črpanju sredstev zelo uspešni, saj je razlika med višino finančnega okvirja za ESRR sklad in izplačanimi sredstvi 258,09 EUR. Za EKSRP sklad finančni podatek še ni zaključen, saj se zadnji projekt LAS Skupaj za več znanja zaključi v letu 2025 in bo takrat tudi izplačan. V primeru, da bo višina izplačanega zahtevka enaka višini odobrenih sredstev, bo razlika med višino finančnega okvirja za EKSRP sklad in izplačanimi sredstvi 2116,90 EUR. Razlog za odstopanje so v veliki meri nižje višine vloženih zahtevkov od odobrenih vrednosti po odločbi za posamezne projekte.

Rezultati vrednotenij za leto 2023:

Doseženi kazalniki LAS s CILjem in obvezni kazalniki posameznega sklada:

EKSRP SKLAD

Kazalniki	Dosežena vrednost na dan 31.12.2023	Ciljna vrednost na dan 31.12.2023
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	16	12
delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenimi finančnim okvirjem	100,00%	100%
delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	93,21%	100%
število novo ustvarjenih delovnih mest - moški (delovna mesta ustvarjena v okviru podukrepa 19.2)	0	0
število novo ustvarjenih delovnih mest - ženske (delovna mesta ustvarjena v okviru podukrepa 19.2)	0	0
Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest	38	20
Št. novih turističnih produktov ali storitev	21	8
Št. enot dediščine na območju, ki so bile ohranjene ali jim je bila dodana vsebina	52	38
Št. novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju	4	1
Št. uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov	12	7

ESRR SKLAD

Kazalniki	Dosežena vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2023	Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023
Število novo ustvarjenih delovnih mest	4	4
Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest	10	10
Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov	1	1
Število vključenih posameznikov	1399	220
Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje CLLD	16	12
Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami	16	11
Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem	100 %	100%
Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije	100 %	100%

Vsi zastavljeni kazalniki obeh skladov so bili konec leta 2023 doseženi oz. preseženi. Zaradi podaljšanja programskega obdobja in dodatnih dodeljenih sredstev za EKSRP sklad, pa še niso bila izplačana vsa sredstva v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije.

Povzetek evalvacije izvedbe SLR LAS s Ciljem v programskem obdobju 2014-2020

Črpanje sredstev: V programskem obdobju 2014 - 2020 je črpanje potekalo kot je bilo predvideno. Večjih odstopanj ni bilo. LAS s Ciljem je v skladu z izvajanjem SLR, vložil vloge za vsa razpoložljiva sredstva v okviru predvidene kvote, vključno za dodatna sredstva dodeljena za uspešnost. Dodatno so bila v programskem obdobju pridobljena sredstva za 11 projektov sodelovanja LAS iz EKSRP sklada.

Izvedba javnih pozivov: v letu 2016 in 2018, sta bila objavljena javna poziva LAS s Ciljem, na katera je prispelo 30 vlog. Na ukrepu Razvoj novih turističnih produktov in storitev, je glede na prijave zmanjkalo sredstev. Veliko zanimanja je bilo tudi na ukrepu Ohranjanje in oživljanje dediščine območja in Aktivaciji potencialov ranljivih skupin. Vsa razpisana sredstva so ostala neporabljena na ukrepih Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov iz ESRR sklada. Iz obeh pozivov, je ostalo skupaj 380.702,88 EUR ne dodeljenih sredstev. Na podlagi rezultatov animacijskih delavnic na območju v letu 2019, se je odločilo, da se za razpoložljiva sredstva pripravi projekte LAS.

Doseganje zastavljenih kazalnikov in mejnikov:

Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2023 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki oz. mejniki potrjeni v SLR. Zaradi podaljšanja programskega obdobja in dodatnih dodeljenih sredstev za EKSRP sklad, pa še niso bila izplačana vsa sredstva v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije.

Specifične teme vrednotenja JP LAS s Ciljem:

V sklopu izdelave vrednotenja, se je evalviralo tudi specifične teme: število podprtih partnerstev, število deležnikov vključenih v izvajanje projektov, strukturo upravičencev po sektorjih in teritorialno pokritost. Rezultati evalvacije, ki so nastali na podlagi pridobljenih podatkov iz 1. in 2. JP LAS s Ciljem, kažejo, da je bilo največ projektov izvedenih iz EKSRP sklada (v okviru SLR je predvidenih tudi več sredstev), v katerih je sodelovalo tudi največ deležnikov. Med upravičenci jih je največ izhajalo iz javnega sektorja (kadrovske kapacitete s predznanjem izvajanja projektov). Največ partnerjev projektov je izhajalo iz območja občine Idrija, sledi občina Logatec in nato iz Občine Cerčno. V projektih sodelujejo tudi trije partnerji, ki imajo sedež v Ljubljani, delujejo pa na območju LAS s Ciljem. V projektih LAS sodeluje LAS in vse tri lokalne skupnosti, glede na vsebino pa se v projekte vključujejo tudi drugi partnerji.

Delovanje VP LAS s Ciljem in izvajanje SLR:

Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov je VP LAS s Ciljem pridobil objektivno oceno svojega delovanja in izvajanja SLR, na podlagi katere bo ohranil oz. nadgradil pozitivne in poskušal popraviti, izboljšati negativne prakse v novem programskem obdobju.

Glede podpore vodilnega partnerja pri izvedbi projektov so vsem vključenim nudene individualne informacije. Zaradi velikega učinka in interesa pa bo vodilni partner med izvajanjem projektov večkrat izvedel animacijske delavnice, ki bodo namenjene upravičencem v posameznem projektu. Animacijske delavnice bodo namenjene pregledu stanja na projektu in izvajanju nadaljnjih aktivnosti.

Pri preverjanju po potrebi po dodatni pomoči glede izvajanja projektov se je ugotovilo, da bi največ upravičencev potrebovalo pomoč pri promociji projektov, zato smo vse upravičence povabili, da posredujejo svoje informacije in nastale produkte, da jih predstavimo na spletni strani LAS.

Veliko upravičencev še vedno meni, da bi jim vodilni partner LAS moral pomagati tudi pri zadevah, ki sicer niso v pristojnosti LAS (npr. ZJN, gradbena zakonodaja, računovodstvo...). Vodilni partner LAS upravičencem nudi informacije, s katerimi razpolaga, tudi, če niso v pristojnosti LAS. Upravičencem bo LAS tudi v prihodnje svetoval in zagotavljal čim več informacij, hkrati pa se jih bo opozarjalo na to, katere informacije je LAS dolžan zagotoviti in katere mora pridobiti prijavitelj oz. upravičenec.

Vzpostavila se je nova spletna stran LAS, ki operativno deluje in nudi potrebne informacije vsem upravičencem. Upravičenci in člani LAS so bili seznanjeni z novo spletno stranjo. Vsi upravičenci nameravajo v nadaljevanju še prijavljati in izvajati projekte. V večini primerov se jim razpisana sredstva zdijo primerna, en upravičenec želi večje investicijske projekte, ki jih zaenkrat zaradi premajhne finančne podpore, LAS ne more izvajati.

Ostale pripombe so izpostavili upravičenci vezano na lasten projekt in njihove individualne izkušnje. Splošna ocena izvajanja strategije in sodelovanja z vodilnim partnerjem je dobra.
